【参考】常総市三坂町地先の土砂掘削について

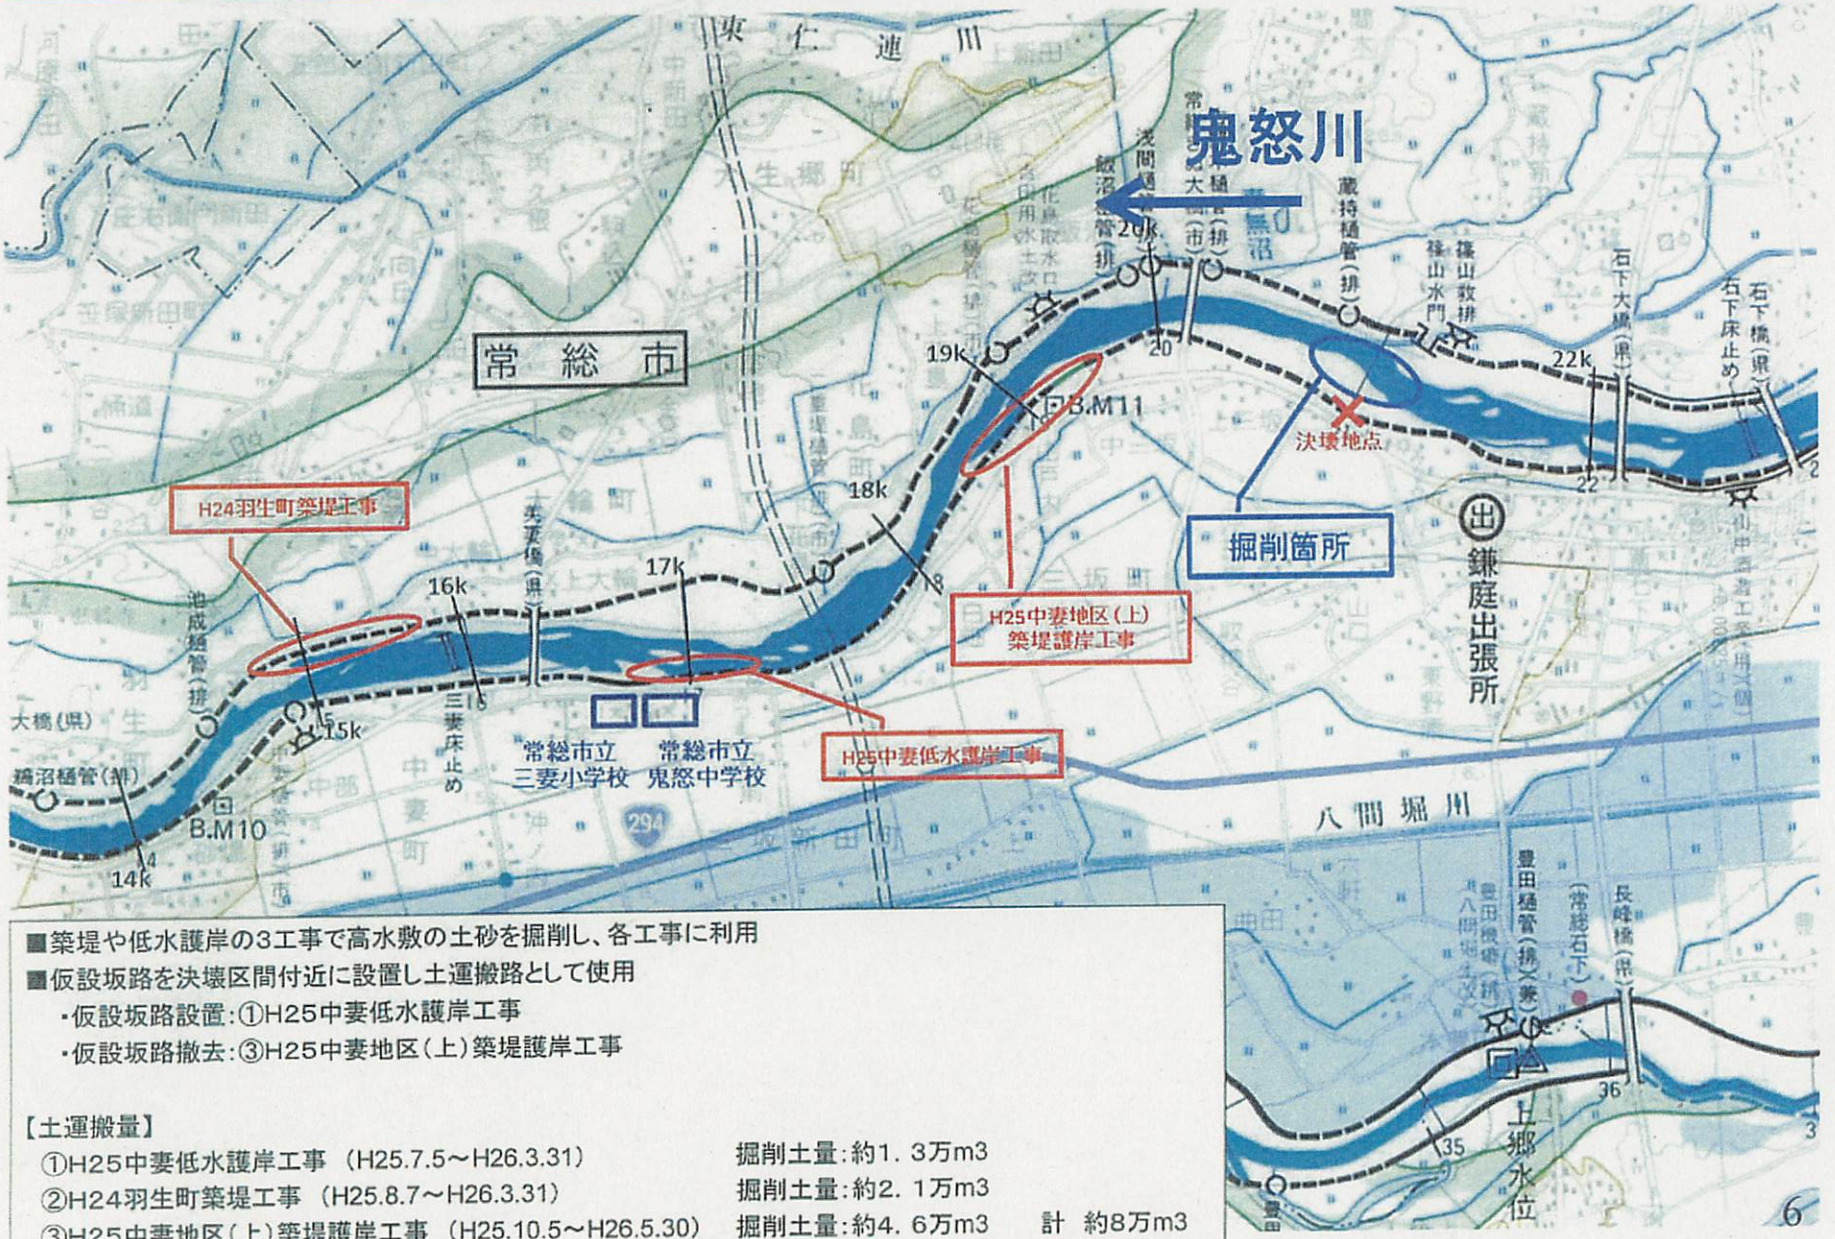

■築堤や低水護岸の3工事で高水敷の土砂を掘削し、各工事に利用

■仮設坂路を決壊区間付近に設置し土運搬路として使用

・仮設坂路設置:①H25中妻低水護岸工事

・仮設坂路撤去:③H25中妻地区(上)築堤護岸工事

【土運搬量】

①H25中妻低水護岸工事 (H25.7.5～H26.3.31)	掘削土量:約1．3万m3	
②H24羽生町築堤工事 (H25.8.7～H26.3.31)	掘削土量:約2．1万m3	
③H25中妻地区(上)築堤護岸工事 (H25.10.5～H26.5.30)	掘削土量:約4．6万m3	計 約8万m3
